



Junio de 2023

San Pedro Garza García, Nuevo León

Acta de Entrega-Recepción

Esta es un acta de entrega-recepción conforme al Reglamento de Participación y Atención Ciudadana, para dejar constancia de que se realizó el proyecto de **Presupuesto Participativo 2022** que propuso en la plataforma Decide San Pedro: **ID 2046 "Reja de Acero perimetral para el arroyo", Colonia Ampliación Valle del Mirador.**

El proyecto se realizó en el perímetro del arroyo, en la Calle Paseo del Rosario y Paseo de la Esperanza, Colonia **Ampliación Valle del Mirador**, San Pedro Garza García, Nuevo León. La entrega-recepción consiste en:

- Retiro de reja existente, y suministro e instalación de reja de acero color verde en perímetro del arroyo.

Lic. Venecia Guzmán Elizondo

Secretaria de Innovación y Participación Ciudadana

Dependencia Coordinadora

Ing. Jesús Ramón Uscátegui Miranda

Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Dependencia Ejecutora

Nombre y firma de ciudadano beneficiado

Representante de la comunidad

ARTURO SOTO CASTILLO

Gustavo Días Ordaz s/n

La Loma, San Pedro, Garza García N.L.

Tel. 52 (81) 8478 2947

Secretaría de Innovación y

Participación Ciudadana

- Se anexan el soporte fotográfico y las órdenes de compra del proyecto.
- Los recursos que el Municipio otorga para la realización del Programa de Presupuesto Participativo estarán sujetos a revisión por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, durante su ejecución o al finalizar el proyecto, así como de las demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes.



Lo que logramos Juntos

Antes:



Después:



Gustavo Díaz Ordaz s/n

La Loma, San Pedro, Garza García N.L.

Tel. 52 (81) 8478 2947

Secretaría de Innovación y

Participación Ciudadana



CHECKLIST PARA RECEPCION DE FACTURAS


Copia

- ☒ Copia de orden de compra
- ☒ Factura original sellada con los datos completos (Número de nomina, nombre y firma)
- ☒ Validación DITO
- ☒ Evidencia fotográfica
- ☒ Oficio de satisfacción en hoja membretada
- ☐ Oficio de resguardo (según lo indique el tramite)
- ☐ Listado de entregables (según lo indique el tramite)
- ☐ Soporte en digital (en caso tramite de apoyo a vivienda, producciones de audio y video)
- ☒ Soporte Participativo (fecha de inicio de trabajos, bitacora, cronograma, croquis y garantía)
- ☒ Oficio y/o Acta Entrega Presupuesto Participativo
- ☐ *Solicitud de Inversión (compra mayor a 70 UMAS incluyendo el IVA)
- ☐ Sello de Patrimonio (según lo indique patrimonio)
- ☒ Folio de sustido (que coincida con la factura)

Símbología

☒ Existencia

☐ No Aplica


Responsable Admvo. Presupuesto Participativo
de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
GARZA GARCIA, N.L.
30 MAY 2023
RECIBO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
DIRECCION DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA

Folio: 481299

FECHA:

2023/02/17

013005 PROVEEDOR: GRUPO IND Y COMERCIAL CENTURION SA DE RIO MISSISSIPPI NO. 128 LOCAL 3 JAVIER INDALECIO GONZALEZ MONTAÑAYOR 8182321034	FECHA DE ENTREGA 28 FEBRERO PLAZO DE PAGO 8 DIAS	CONDICIONES DE PAGO	NÚMERO DE REQUISICIÓN 496216
	DEPARTAMENTO SOLICITANTE 1130 DIR. DE SERVICIOS GHAIS Compras- ROPALSA RODRIGUEZ PARTIDA	LUGAR DE ENTREGA DIR. SERVICIOS GENERALES PADRE MIER 109 ESQ. JOSE VASCORRUELOS	

OBSERVACIONES
ELABORA SANDRA RODRIGUEZ PARRA P.TTO PARTICIPATIVO 2022/06 ALEJANDRO DAVILA 8118344541 ANEXO ESPE
El material se utilizará en COL. AMPLIACIÓN VALLE DEL MIRADOR (D. 2049) REJA DE ACERO PERMETRAL PARA EL AGUOTO (TECNICO P.C.O. N)

ACORDAMOS LAS CONDICIONES Y
EL CONTENIDO DE ESTE ORDEN DE COMPRA
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

CONS. CANTIDAD	UNIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	LVA.	TOTAL
1.00	LOTE	531128463300	SERVICIO DE MONTE DE AREA DONDE SE INSTALABA COSTUMETNO S LINEALES DE PANELES Y POSTES DE RELACERO.	4,537.97	4,537.97	728.01	5,265.98
1.00	SERV	531128463306	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE SANTUARIO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRO PANELES TIPO BIELACENO DE 2.00 MTS. DE ALTURA POR 2.50 MTS. DE ANCHO EN COLOR VERDE CALIBRE	2,187.90	2,187.90	350.06	2,537.96
158.00	PZA	531128463306	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE SANTUARIO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRO PANELES TIPO BIELACENO DE 2.00 MTS. DE ALTURA POR 2.50 MTS. DE ANCHO EN COLOR VERDE CALIBRE	1,350.33	213,352.14	34,135.34	247,487.48
158.00	PZA	531128463306	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE SANTUARIO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRO PANELES TIPO BIELACENO DE 2.00 MTS. DE ALTURA POR 2.50 MTS. DE ANCHO EN COLOR VERDE CALIBRE	872.35	98,164.80	15,394.77	113,559.57
672.00	PZA	531128463306	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE SANTUARIO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRO PANELES TIPO BIELACENO DE 2.00 MTS. DE ALTURA POR 2.50 MTS. DE ANCHO EN COLOR VERDE CALIBRE	38.78	26,732.16	4,277.15	31,009.31
1.00	LOTE	531128463306	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE SANTUARIO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRO PANELES TIPO BIELACENO DE 2.00 MTS. DE ALTURA POR 2.50 MTS. DE ANCHO EN COLOR VERDE CALIBRE	50,122.80	50,122.80	8,019.65	58,142.45
1.00	PZA	531128463306	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE SANTUARIO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRO PANELES TIPO BIELACENO DE 2.00 MTS. DE ALTURA POR 2.50 MTS. DE ANCHO EN COLOR VERDE CALIBRE	17,102.05	17,102.05	2,736.83	19,838.88
1.00	LOTE	531128463306	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE SANTUARIO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRO PANELES TIPO BIELACENO DE 2.00 MTS. DE ALTURA POR 2.50 MTS. DE ANCHO EN COLOR VERDE CALIBRE	11,157.52	11,157.52	1,782.00	12,939.52

COMPRADOR(A)

COORDINADOR DE COMPRAS

DIRECCION DE ADQUISICIONES

REVISO PROCESO

TESORERIA EGRESOS

REVISION: 0

FORMATO: ADQUISICION



CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 234100

Total

421,325.54

07/01/2011

488,730.25

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

Folio:

FECHA:

PROVEEDOR

FECHA DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

NÚMERO DE
REQUISICIÓN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

LUGAR DE ENTREGA

OBSERVACIONES

ACEPTAMOS LAS CONDICIONES Y
EL DOMINIO DE ESTA ORDEN DE COMPRA

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

CANTIDAD UNIDAD CUENTA
CONTABLE

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

I.V.A.

TOTAL

COMPROBATORIA

COORDINADOR DE COMPRAS

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

REVISÓ PROCESO

TESORERIA EGRESOS

REVISIÓN

FORMATO: ADQS-01
1/2



Grupo Industrial y Comercial Centurión, S.A. de C.V.
R.F.C. GIC090624C13

Rio Mississippi, No. 128, L-9 Col. Del Valle
San Pedro Garza García, Nuevo León CP. 66220
Tel. (81) 8335 8325

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NL

FOLIO FISCAL

62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954

RFC MSP8212143G3 USO CFDI 003 Gastos en general

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

DOMICILIO F 65200

FORMA PAGO 99- Por definir

00001000000509846663

TIPO COM F Ingreso

MÉTODO PAGO PPD Pago en parcialidades o diferido

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

RÉGIMEN R 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

00001000000503665352

RÉGIMEN E 601 General de Ley Personas Morales

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

F. EMISIÓN 2023-05-11 11:16:00

EXPORTACIÓN 01-No aplica

2023-05-11 11:16:10

CONSECUTIVO: 2158

Cantidad	Unidad	C. Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	LO	11162106	SERVICIO DESMONTE DE ÁREA DONDE SE INSTALARA LOS 390 METROS LINEALES DE PANELES Y POSTES DE REJADERO	4,537.57	0.00	726.01	0.16	4,537.57
1.00	E48	11162106	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE SANITARIO PORTÁTIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA	2,187.90	0.00	350.06	0.16	2,187.90
183.00	H87	11162106	SUMINISTRO PANELES TIPO REJADERO DE 2.00 MTS. DE ALTURA POR 2.50 MTS. DE ANCHO EN COLOR VERDE CALIBRE 6	1,360.39	0.00	34,136.34	0.16	213,302.14
163.00	H87	11162106	SUMINISTRO POSTE CUADRADO PARA REJADERO A BASE DE PTR GALVANIZADO DE 2 1/4" X 3 1/4" DE 2.50 MTS. DE ALTURA EN COLOR VERDE CALIBRE 16. INCLUYE TAPA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO CON PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV	572.35	0.00	15,384.77	0.16	96,154.80
572.00	H87	11162106	SUMINISTRO ABRAZADERAS METÁLICAS CON TUERCA Y TORNILLO EN COLOR VERDE	39.76	0.00	4,277.55	0.16	26,732.16
1.00	LO	11162106	SERVICIO INSTALACIÓN DE PANELES Y POSTES TIPO REJADERO MEDIANTE CIMENTACIÓN PARA 390 METROS LINEALES CON QUEBRES, EXCAVANDO UN POZO DE 3.0M DE DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.50M	50,122.80	0.00	8,019.85	0.16	50,122.80
1.00	H87	11162106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON ABATIBLE DE REJADERO A BASE DE PTR GALVANIZADO DE 2.50 MTS. DE ALTURA X 3.80 MTS. DE ANCHO A DOS HOJAS DE 1.80 MTS. CADA UNA, EN COLOR VERDE, CON DOS PICAPORTES Y CON PASADOR	17,102.00	0.00	2,736.33	0.16	17,102.05
1.00	LO	11162106	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y RETIRO DE 390 METROS LINEALES DE MALLA CILÍNDRICA GALVANIZADA EXISTENTE DE 2.00 MTS. DE ALTURA INSTALADA MEDIANTE CIMENTACIÓN	11,137.52	0.00	1,782.00	0.16	11,137.52

ORDEN DE COMPRA NO. 40129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
GARZA GARCÍA, N.L.

30 MAY 2023

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



IVA(6.00%)=91453.31 38 Por defecto

Importe en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 MN.

Subtotal: \$421,329.94
Desc: \$0.00
IVA: \$67,412.31
Ret IVA: \$0.00
Ret ISR: \$0.00
Total: \$488,739.25



Seño digital del CFDI:

TCGwF7YCom4kggag3dRUVKQpuePmPmTgkQRMJ8gJkcuWjDvUdCpW2236z3B6vUUpfUedpMgV8h+Q3akd4pYp000Pcz+6AcDOP38897vWspUHR
6ufv6LH4d4P7Y6H50d4gQm23d4pPp93a0H8gUd9CwU8TfP64vH23+e8B1gAgUW4P4vY8h+Teeu32NM3aTEAF010DCEpLWw9gE642VTf8P+M63K8vM
4uFHA+uUy0RPG2BFD4p4Teeu800pYCG+

Seño del SAT:

62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954
62d5c96-514d-4578-b5fa-a2aba931954



GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CENTURION

GIC090624C13

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

2158

UUID

67d9c80-3140-4570-b6fa-a2a6a931964

Fecha de emisión

11/05/2023 11:16:00 a.m.

Lugar de emisión

60220

Expectación

01 - No aplica

Versión

4.0

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NL

MSP8212143G3

Uso de CFDI

000 - Cuentas en general

Domicilio

66200

Régimen Fiscal

601 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Código impuesto	Valor unitario	Descuento	Importe
1.00	11162100	LO - Edo (unidad de adquisición)	SERVICIO DESMONTE DE AREA DONDE SE INSTALARA LOS 390 METROS LINEALES DE PANELES Y POSTES DE REJACERO.	02	4,537.57		4,537.57
		Impuesto trasladado	IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 16.00 % IMPORTE: \$726.61				
1.00	11162100	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE SANITARIO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA	02	2,187.00		2,187.00
		Impuesto trasladado	IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 16.00 % IMPORTE: \$350.00				
156.00	11162100	H67 - Pieza	SUMINISTRO PANELES TIPO REJACERO DE 2.00 MTS. DE ALTURA POR 2.50 MTS. DE ANCHO EN COLOR VERDE CALIBRE 6.	02	1,353.33		213,352.14
		Impuesto trasladado	IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 16.00 % IMPORTE: \$34,156.34				
168.00	11162100	H67 - Pieza	SUMINISTRO POSTE CUADRADO PARA REJACERO A BASE DE PTR GALVANIZADO DE 2.144sqm X 2.144sqm DE 2.50 MTS. DE ALTURA EN COLOR VERDE CALIBRE 10. INCLUYE TAPA PLASTICA DE POLIPROPILENO CON PROTECCION A LOS RAYOS UV.	02	572.35		96,154.60
		Impuesto trasladado	IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 16.00 % IMPORTE: \$16,364.77				
572.00	11162100	H67 - Pieza	SUMINISTRO ABRAZADERAS METALICAS CON TUERCA Y TORNILLO EN COLOR VERDE.	02	39.78		26,732.16
		Impuesto trasladado	IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 16.00 % IMPORTE: \$4,277.15				
3.00	11162100	LO - Edo (unidad de adquisición)	SERVICIO INSTALACION DE PANELES Y POSTES TIPO REJACERO MEDIANTE CIMENTACION PARA 390 METROS LINEALES CON QUEBRES. EXCAVANDO UN POZO DE .25M DE DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.50M	02	50,122.60		50,122.60
		Impuesto trasladado	IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 16.00 % IMPORTE: \$8,019.61				
1.00	11162100	H67 - Pieza	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON ABATIBLE DE REJACERO A BASE DE PTR GALVANIZADO DE 2.50 MTS. DE ALTURA X 3.80 MTS. DE ANCHO A DOS HOJAS DE 1.90 MTS. CADA UNA EN COLOR VERDE, CON DOS PICAPORTES Y CON PASADOR.	02	17,102.05		17,102.05
		Impuesto trasladado	IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 16.00 % IMPORTE: \$2,736.33				
1.00	11162100	LO - Edo (unidad de adquisición)	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE 390 METROS LINEALES DE MALLA CLOCONICA GALVANIZADA EXISTENTE DE 2.50 MTS. DE ALTURA INSTALADA MEDIANTE CIMENTACION.	02	11,137.52		11,137.52
		Impuesto trasladado	IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 16.00 % IMPORTE: \$1,782.00				

Subtotal 421,326.94

IVA 16.00 % 67,412.91

No. serie CSD SAT
000100000502840663Fecha y hora de certificación
11/05/2023 11:16:10 a.m.No. serie CSD emisor
000100000502840662

Sello digital del emisor

PKCS#10 Certificate Request (CER) for the issuer. The certificate is signed by the issuer's private key. The certificate contains the issuer's public key and the issuer's name. The certificate is valid for 10 years.

Sello digital del SAT

PKCS#10 Certificate Request (CER) for the SAT. The certificate is signed by the SAT's private key. The certificate contains the SAT's public key and the SAT's name. The certificate is valid for 10 years.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Original chain of the digital certificate complement. This is a long alphanumeric string representing the digital signature and other metadata.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 2

20230510 092346



20200116102240

17 de marzo del 2023

San Pedro Garza García Nuevo León

Ing. Francisco Meléndez Bravo
Arq. Mónica Azpitia
Secretaría de Servicios Públicos
San Pedro Garza García, Nuevo León

Entrega según
que quisiere

Por medio de la presente hago entrega en bodega de Servicios Públicos la cantidad de 70 ML de
reja maya acero, retirada dentro del proyecto de Presupuesto Participativo del 2022 en la colonia
Ampliación Valle del Mirador, sector K6.

Lo anterior como especificación dentro de la orden de compra 481299

Federico GZ - 811-039-30-53
Federico Esteban Gallegos Zapata.





REJAS CENTURION Sa. De Cv.

José de Jesús G.S.



Col. Ampliación Valle del Mirador
(Canal del Arroyo Seco)



CENTURION
SOUTH AMERICA'S LEADING CONSTRUCTION COMPANY

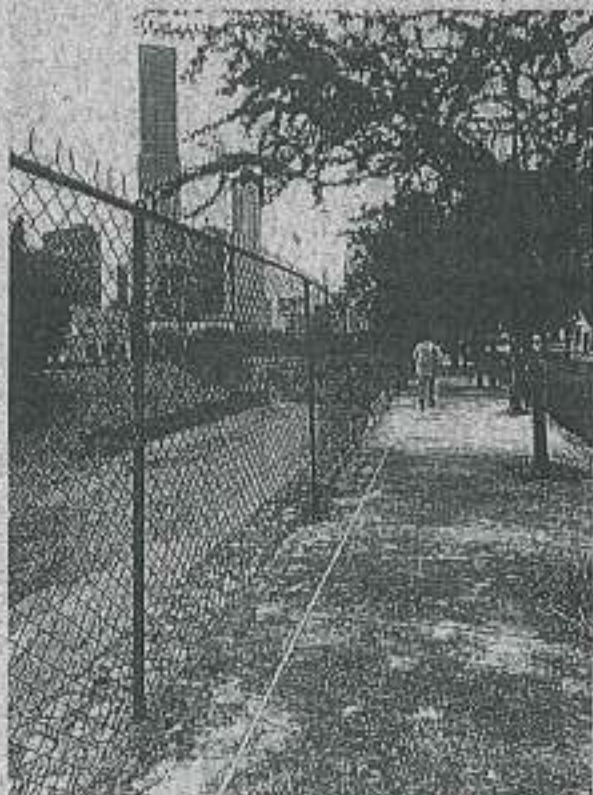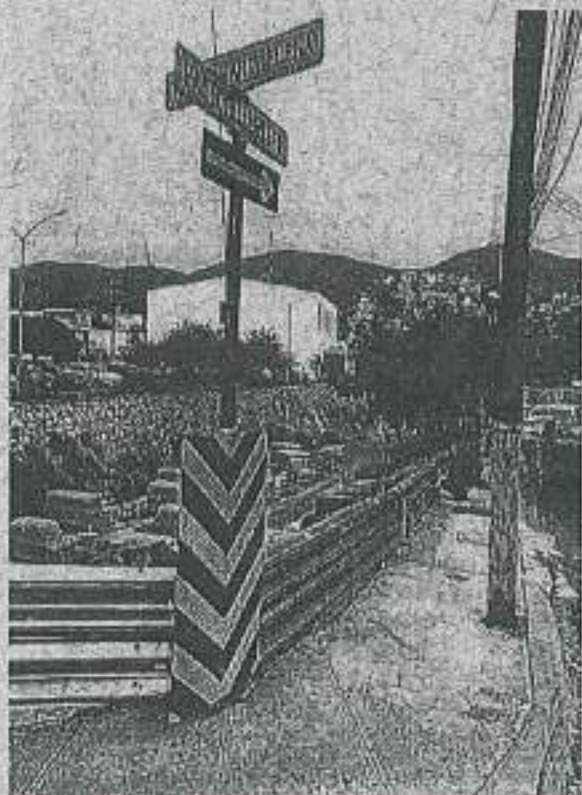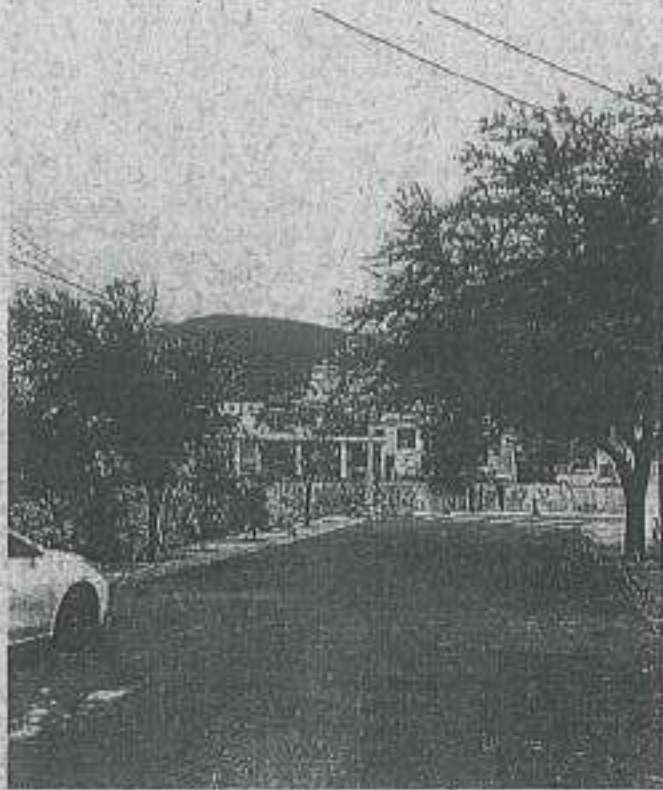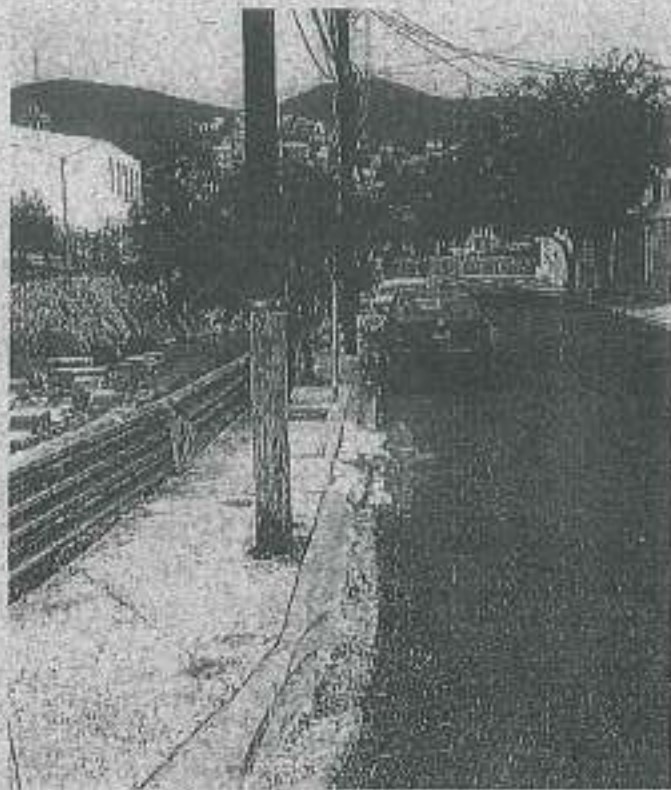

CH

Col. Ampliación Valle del Mirador
(Canal del Arroyo Seco)



CENTURION
SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

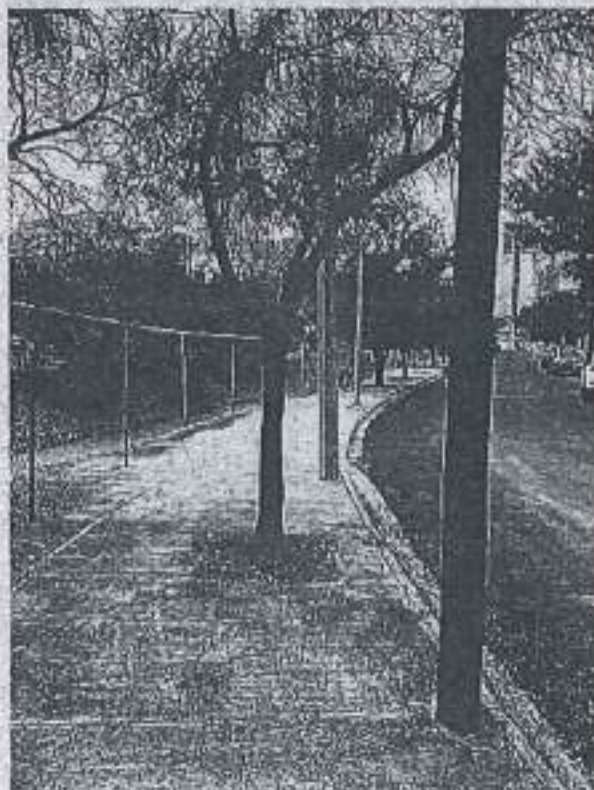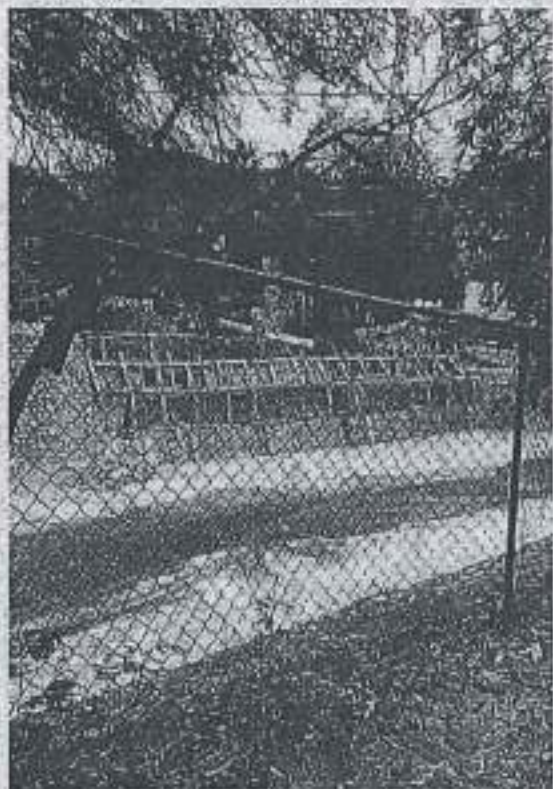

col




Col. Ampliación Valle del Mirador
(Canal del Arroyo Seco)

CENTURION
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

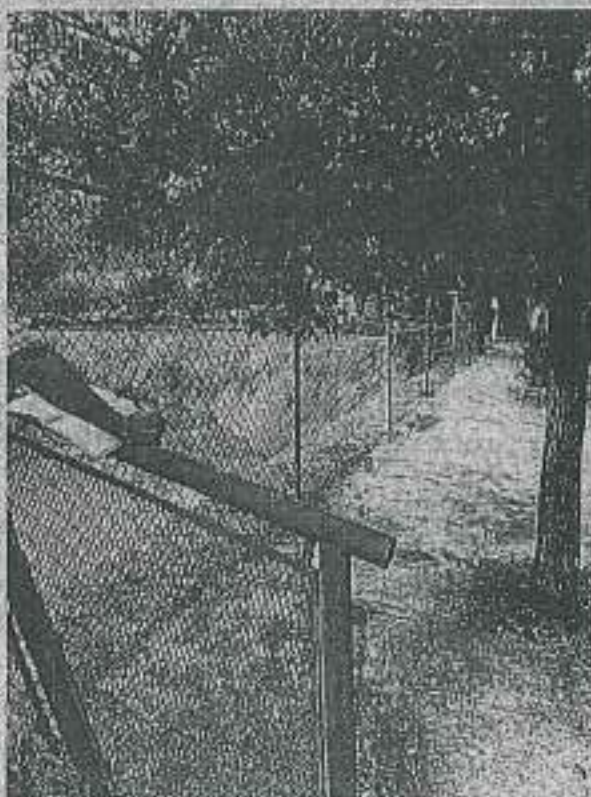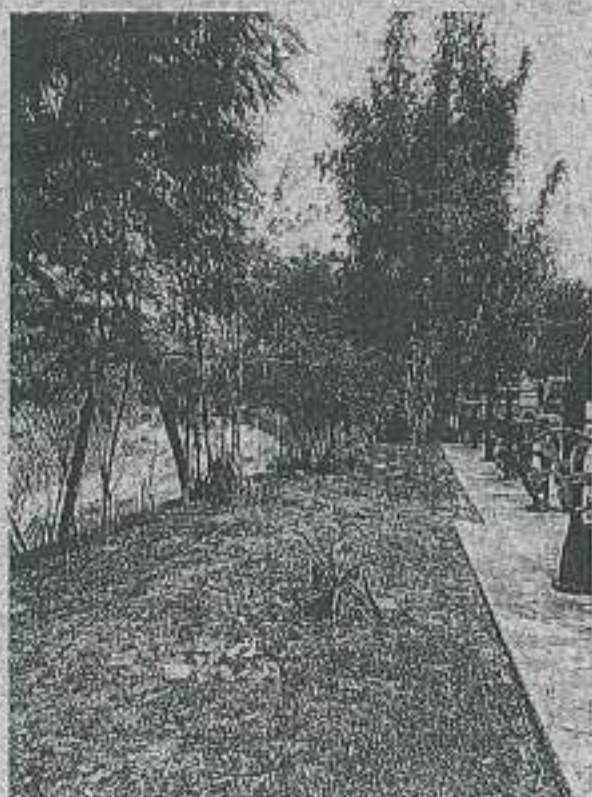

Cal




Col. Ampliación Valle del Mirador
(Canal del Arroyo Seco)

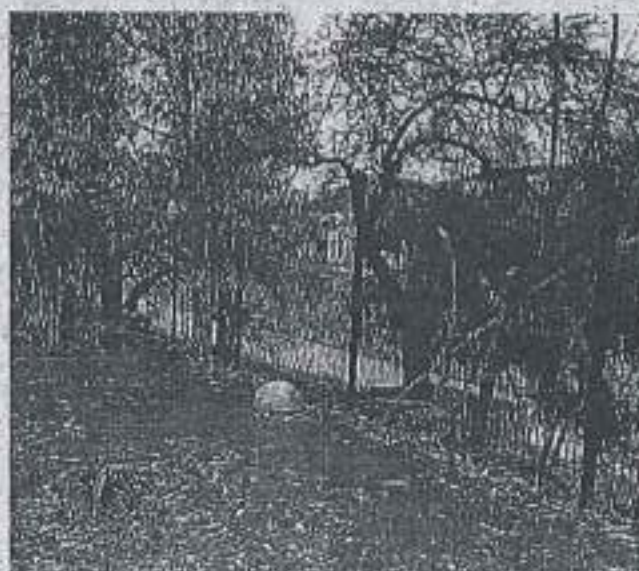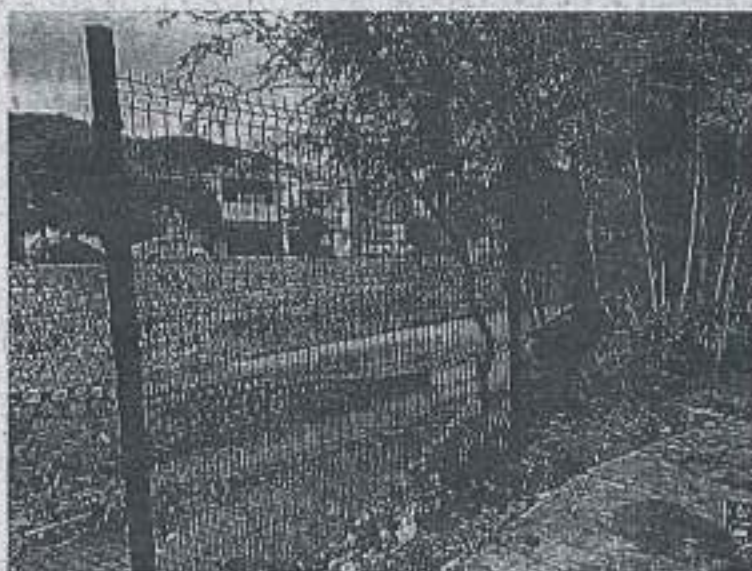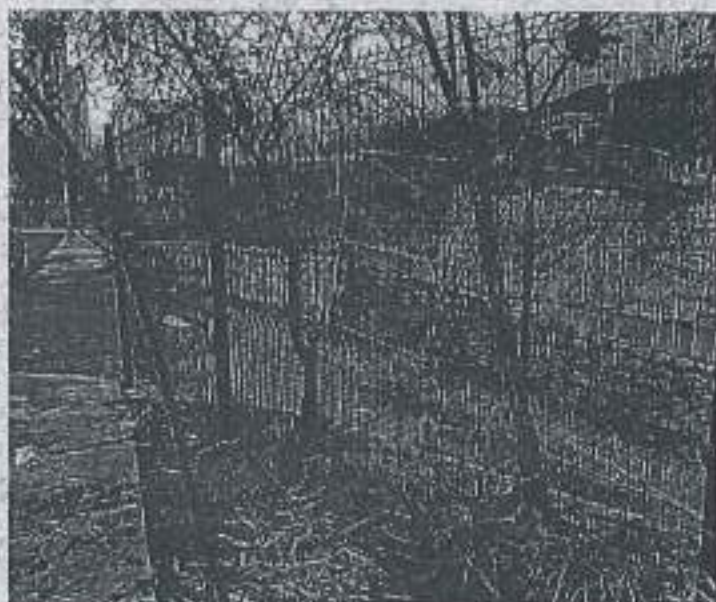

Handwritten signature or initials.

Col. Ampliación Valle del Mirador/
(Canal del Arroyo Seco)


CENTURION
SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

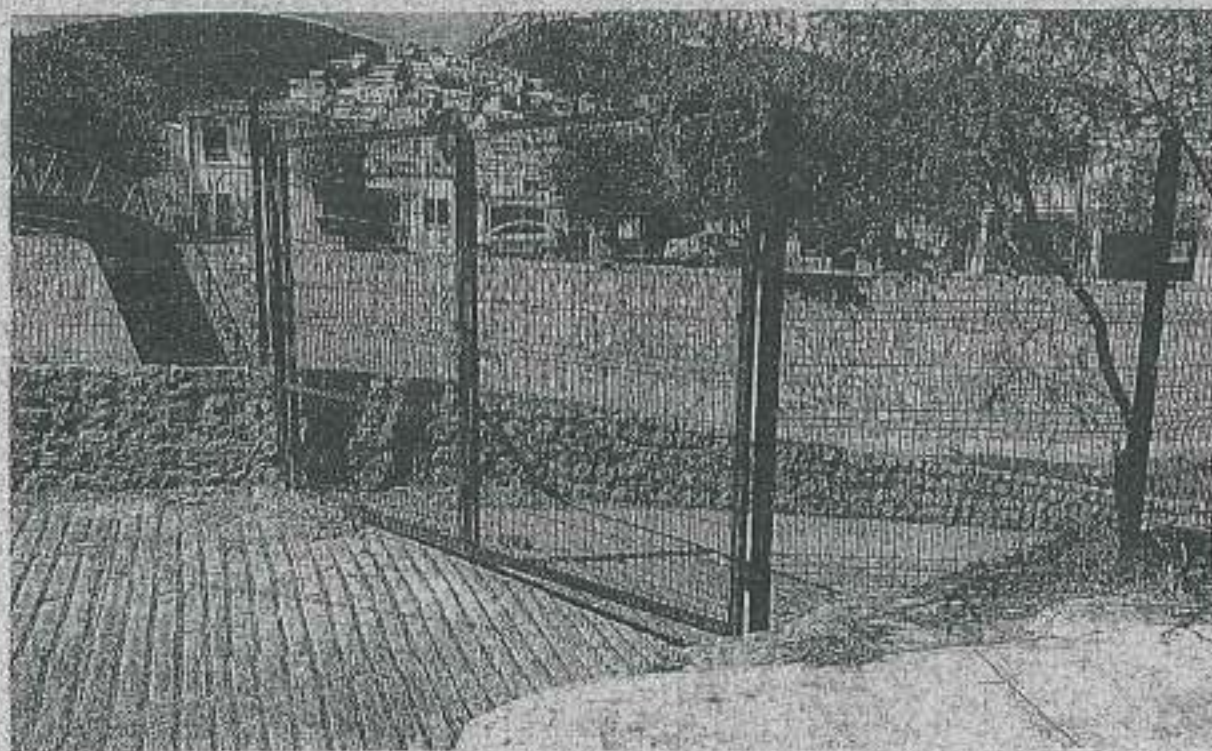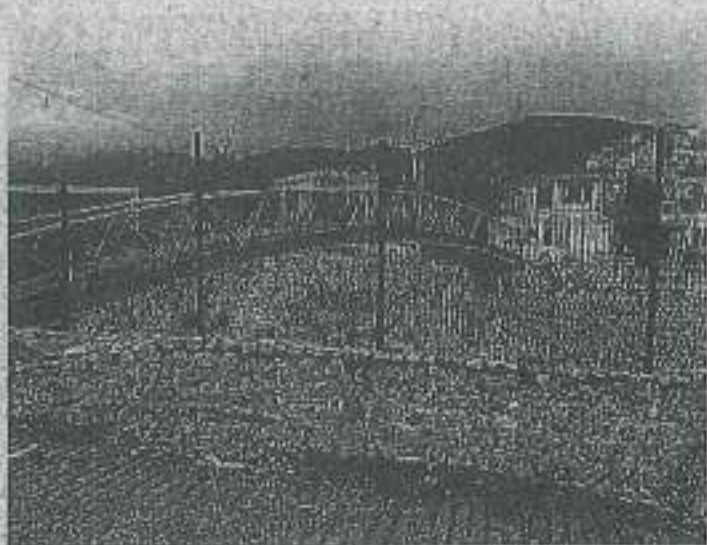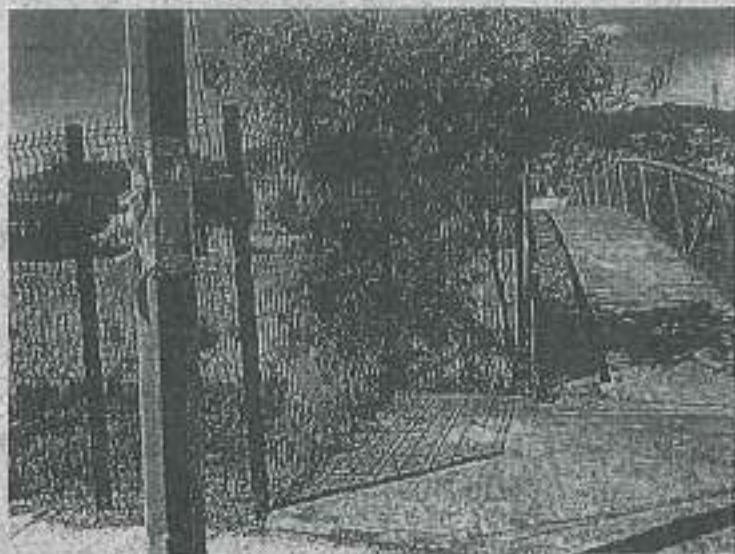

Col

Col. Ampliación Valle del Mirador
(Canal del Arroyo Seco)



CENTURION
SARCA INDUSTRIAL A GENERAL CORONA S. DE RL DE CV

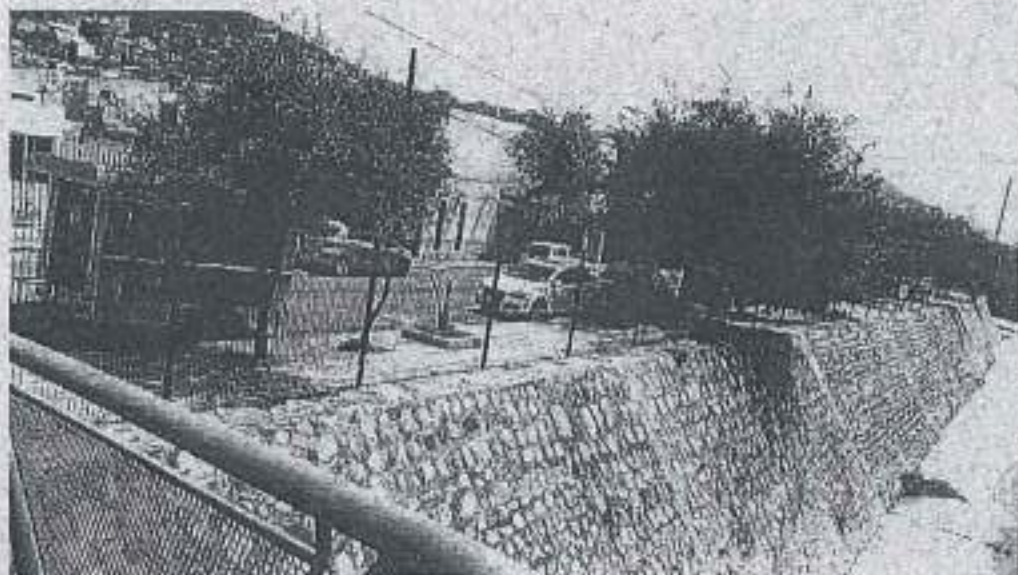

CP

Col. Ampliación Valle del Mirador
(Cáanal del Arroyo Seco)

CENTURION
SANTO DOMINGO DE LOS CABALLEROS, DOMINICANA, D.R. © 2010

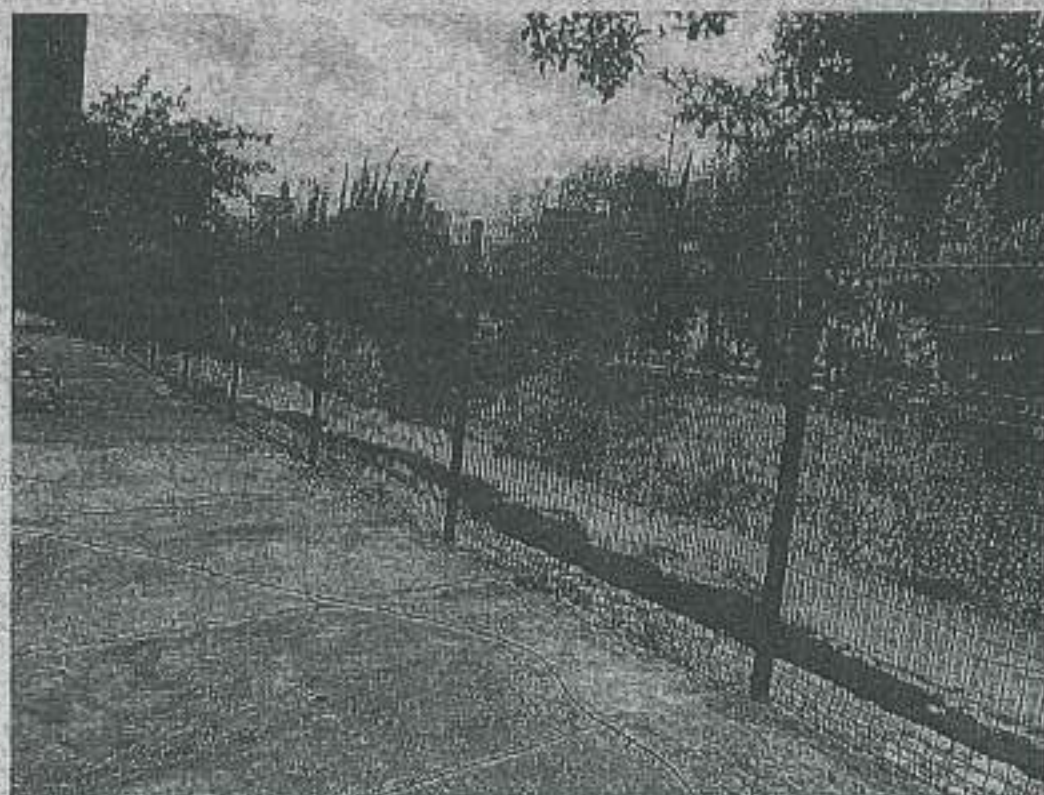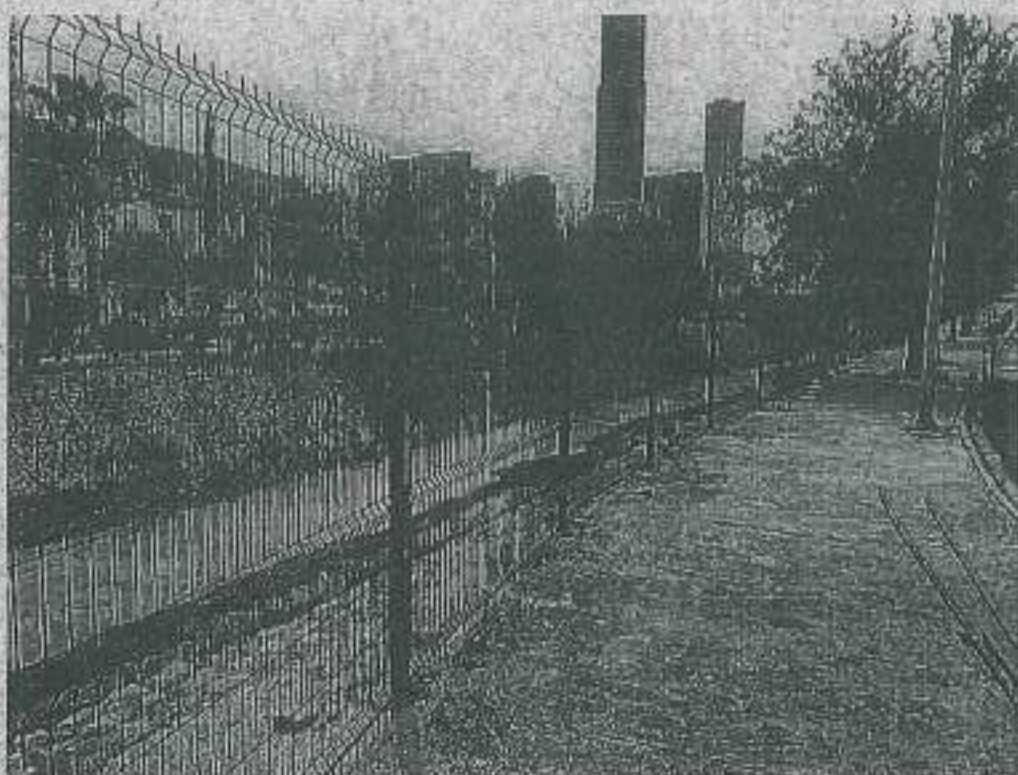

CH

San Pedro Garza García, N.L. a 22 de febrero de 2023

C. Francisco Meléndez Bravo
Responsable Técnico de Presupuesto Participativo
Presente.

En relación a los trabajos del proyecto "Cambio de malla ciclónica por reja de acero en límites canal del Arroyo Seco de la Col. Ampliación Valle del Mirador", por medio de la presente le informo, que el día 06 de marzo de 2023, iniciaremos los trabajos de instalación y teniendo como fecha para terminarlos, si las condiciones del clima lo permiten, el próximo 03 de abril de 2023.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



Javier Indalecio González Montemayor
Representante Legal

Cronograma de Instalación de Rejucro en la Col. Ampliación Viena del Mirador (Canal del Arroyo Seco)

Proveedor: Grupo de Licitación
 Encargado del proyecto por parte del Municipio: Grupo Industrial y Comercial Cerunon S.A. de C.V.
 Gerente (a) del proyecto: Francisco Hernández Bravo
 Supervisor del proyecto: Javier I. González / Víctor Martínez
 03 de abril de 2013

Fecha de inicio: 06-Mar
 Fecha final: 03-Apr *Nota: Se viene un día festivo, el 30 de marzo.

Concepto	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Duración (Días hábiles)	Estatus	06 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 3
* Destrucción y retiro de 300 metros lineales de malla ciclónica galvanizada existente de 2.00 mts. de altura instalada mediante cemento (bolsa de cemento correspondiente), así como el traslado a la bodega de Alra.	06-Mar	10-Mar	5	Por iniciar				
* Instalación de postes y postes tipo vigas para malla ante cimentación	13-Mar	17-Mar	5	Por iniciar				
* Instalación de postes y postes tipo vigas para malla ante cimentación	21-Mar	24-Mar	4	Por iniciar				
* Instalación de postes, postes tipo vigas y de fondo estable de 3.80 mts. x 1.50 mts. de altura mediante cemento.	27-Mar	03-Apr	5	Por iniciar				

C.F. Javier Indacido González M.

Croquis

Canal del Arroyo Seco de la Col. Ampliación Valle del Mirador



centurion
A Division of Centurion International, Inc. 800.451.1000

C.P. Javier I. González M.
Grupo Industrial y Comercial Centurión

San Pedro Garza García, N.L. a 15 de mayo de 2023

C. Francisco Meléndez Bravo

Responsable Técnico de Presupuesto Participativo

Presente.-

En relación a los trabajos del proyecto "Cambio de malla ciclónica por reja de acero en límites canal del Arroyo Seco de la Col. Ampliación Valle del Mirador", por medio de la presente, le confirmo que éstos tienen garantía de 5 años, por daños de fabricación y/o defectos físicos de producción y de vicios ocultos, a partir de su instalación, así mismo, nos comprometemos a solucionar cualquier problema que se presente, con la colaboración del Municipio.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



Javier Indalecio González Montemayor
Representante Legal

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 25 de mayo del 2023


OFICIO DE SATISFACCIÓN
Presupuesto Participativo Municipal 2022

A través de este oficio, reconocemos la finalización de los trabajos relativos a la factura 2158, del proveedor GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CENTURION SA DE CV correspondiente a la Requisición 498216 y Orden de Compra 481299 reconociendo que los servicios prestados por el proveedor fueron satisfactorios.

Estos trabajos forman parte del proyecto con identificación 2046, de la colonia COL AMPLIACION VALLE DEL MIRADOR, proyecto de Sector K6 registrado en la plataforma Decide San Pedro (decide.sanpedro.gob.mx) como parte del ámbito comunitario del presupuesto participativo municipal 2022.

Este proyecto comprende elementos adicionales a los trabajos referidos en este oficio. Concluidos todos los elementos del proyecto, se firma el acta entrega-recepción conforme al Artículo 431 del Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para revisión de los órganos fiscalizadores competentes.

Firman de conformidad:



Lic. Johanna Mudd Frankenberg
Directora de Servicios Generales



Arg. Monica Ines Espitia Esquivel
Responsable Técnico del Proyecto Participativo



Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Dirección de Adquisiciones

Folio de Surtido No. 471313

Orden de Compra No. 481299

Fecha Surtido: Jueves, 29 de mayo de 2023, 02:06:34 p.m.

Proveedor:

Requisición No. 496216

Solicitante:

013025 GRUPO IND Y COMERCIAL CENTURON SA DE

2158

Fecha: Jueves, 11 de mayo de 2023

1130 DIR. DE SERVICIOS GRALS

Entregar en:

DIR. SERVICIOS GENERALES PADRE MIER 109 ESQ. JOSE VASCONCELOS

Saldo O.C.	Facturado	Surtido	Descripción	\$ Saldo O.C.	\$ Facturado	\$ No facturado	\$ Surtido
158.00	158.00	158.00	SUMINISTRO PANELES TIPO RELACERO DE 2.00	247,488.48	247,488.48		247,488.48
188.00	188.00	188.00	SUMINISTRO POSE CUADRADO PARA	111,539.57	111,539.57		111,539.57
872.00	872.00	872.00	SUMINISTRO ABARZADERAS METALICAS CON	31,009.31	31,009.31		31,009.31
1.00	1.00	1.00	SERVICIO INSTALACION DE PANELES Y POSTES	58,142.45	58,142.45		58,142.45
1.00	1.00	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	19,838.38	19,838.38		19,838.38
1.00	1.00	1.00	SERVICIO DESINSTALACION Y RETIRO DE	12,919.52	12,919.52		12,919.52
1.00	1.00	1.00	SERVICIO DESMONTAJE DE AREA DONDE SE	5,253.58	5,253.58		5,253.58
1.00	1.00	1.00	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE SANTARIO	2,537.96	2,537.96		2,537.96
Total				488,739.25	488,739.25		488,739.25

*** (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 25,100 M.N.) ***

Recibí

Sandra López Rodríguez
063773 SANDRA LOPEZ RODRIGUEZ

Este documento deberá ser presentado por el proveedor en la Dirección de Adquisiciones, para que se le entregue su orden de pago.
